
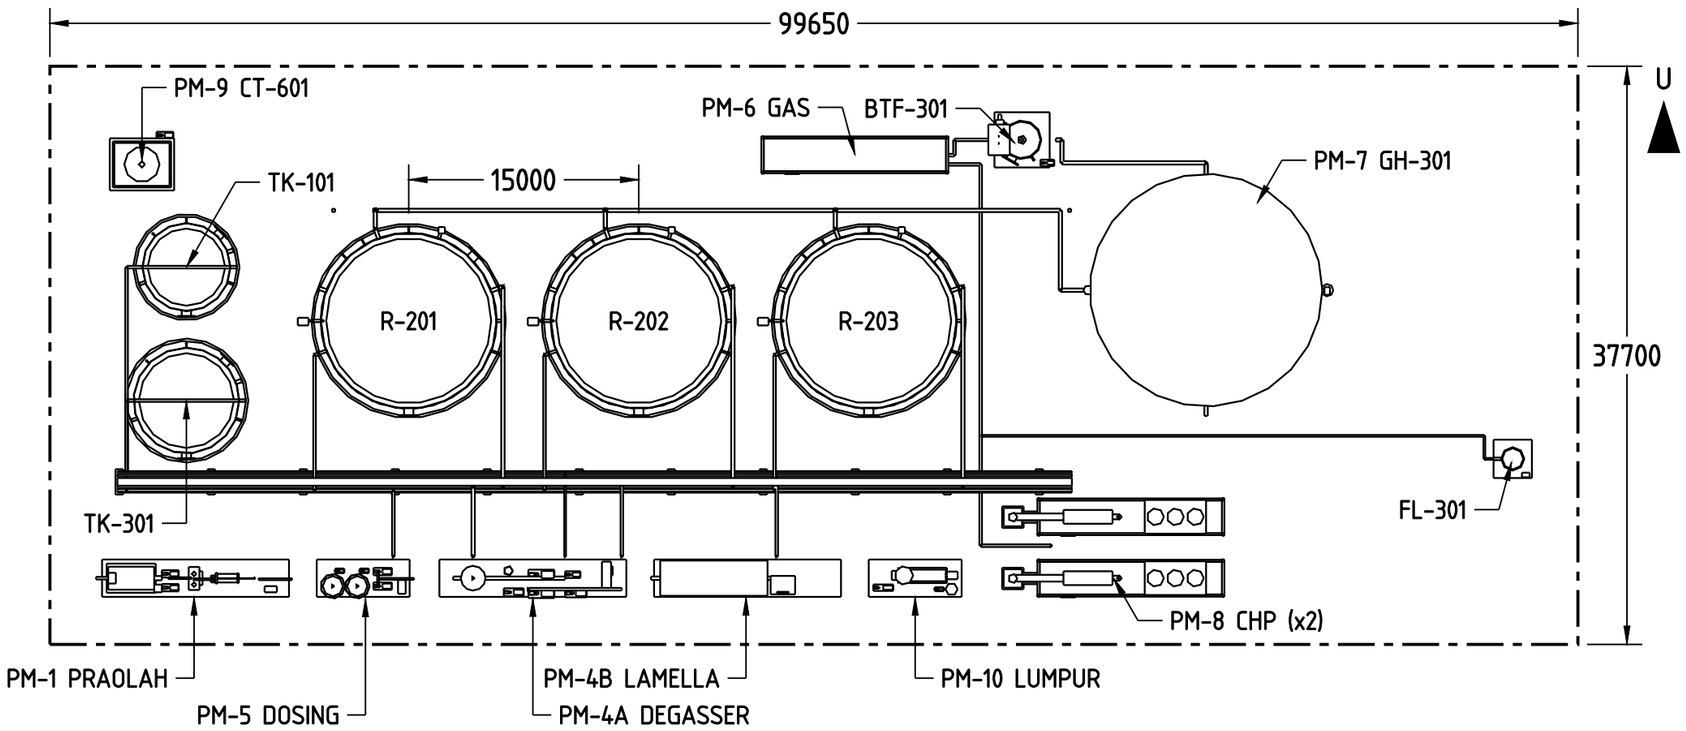


DENAH TATA LETAK (DARI MODEL 3D)

SKALA 1:400

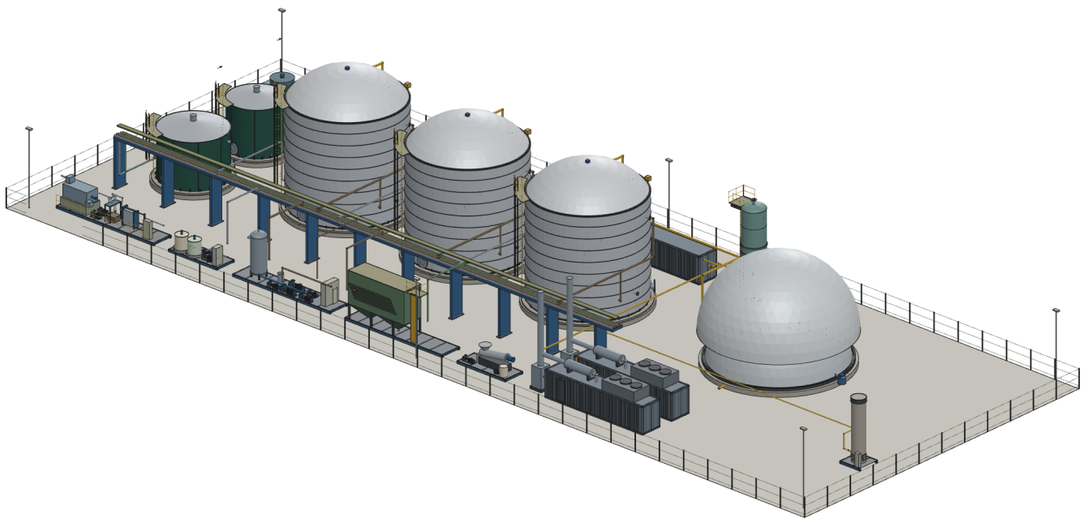

ISOMETRI SUSUNAN PABRIK (TANPA SKALA)

SET MODUL (DAPAT DIPINDAH)				
Modul	Nama	Jml	Pengiriman	Massa t
PM-1	Skid praolah POME	1	kontainer 40 ft (skid)	12.0
PM-2	Tangki GFS penyangga umpan	1	panel GFS dalam kontainer 40 ft	10.8
PM-3	Reaktor kontak termofilik (GFS)	3	panel GFS dalam kontainer 40 ft	113.8
PM-4	Skid kontak: degasser + lamella	1	2 skid 40 ft	18.0
PM-5	Skid dosing dan pompa umpan	1	skid 20 ft	8.0
PM-6	Skid pengolahan biogas	1	kontainer 40 ft + bejana BTF	14.0
PM-7	Penampung gas + flare	1	kontainer 20 ft + skid flare	7.0
PM-8	Kontainer CHP	2	kontainer 40 ft HC	40.0
PM-9	Skid pemulih panas + menara pendingin	1	skid 20 ft + sel CT modular	9.0
PM-10	Tangki GFS efluen + skid lumpur	1	panel GFS + skid 20 ft	21.3

Total 21 muatan kontainer/truk, ± 254 t. Plot 99.7 x 37.7 m = 0.38 ha (termasuk jalan 3 m).

SKALA SET (TANGKI STANDAR SAMA)					
PKS	Tangki GFS	Genset	Neto kWe	GWh/thn	Lamella m²
30 t/jam	2	2 x 400 kWe	681	3.5	54
45 t/jam	3	2 x 600 kWe	1025	5.3	81
60 t/jam	4	2 x 800 kWe	1369	7.0	108

hari nameplate; GWh/thn = rata-rata tahunan (util 0,75).

University: UNIVERSITAS	Checked by : -	Design Lab.	Document type: General Arrangement			Rev: 2
	Author : NAMA TIM	Tata Letak Umum Set Biogas PKS 45 t TBS/jam (Rev 2)	Unit: mm	Scale: 1 : 400	Creation date: 15/10/2026	Size: A3
	Eng. Approved by : -		BG-GA-001			Sheet number: 1 / 9
