



PM-4A DENAH 1:80

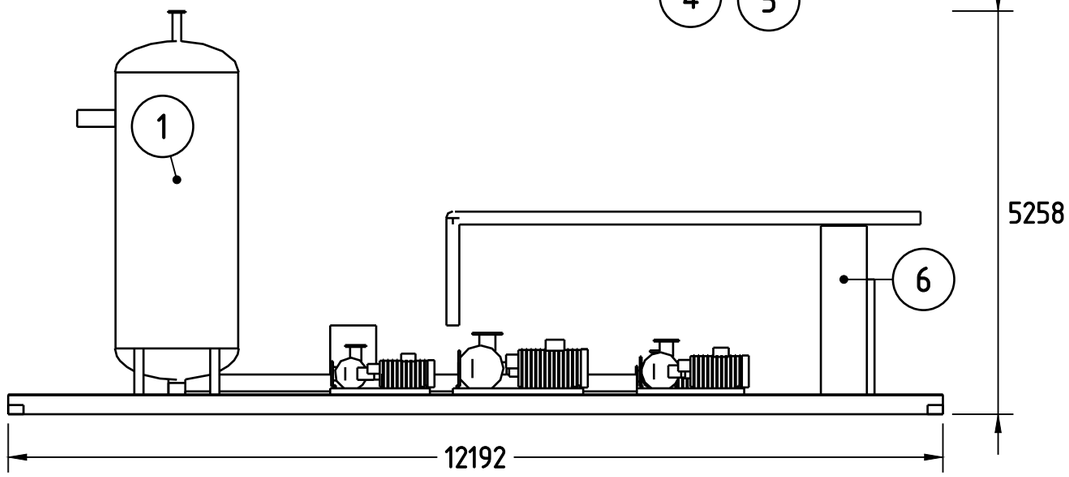

PM-4A TAMPAK SAMPING 1:80

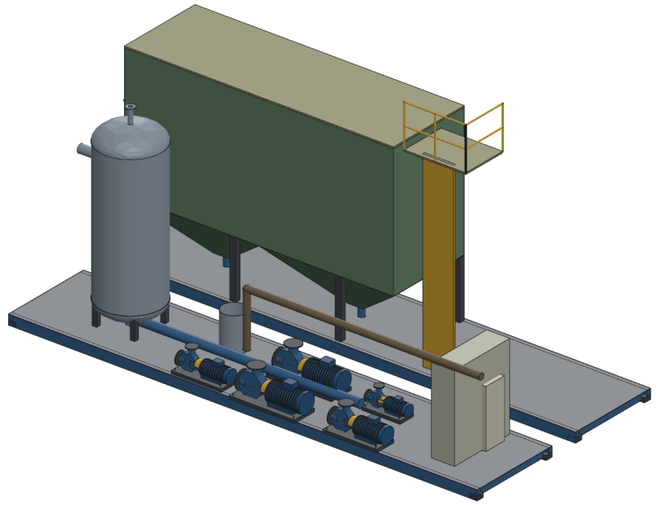


ISOMETRI PM-4A + PM-4B (TANPA SKALA)


DAFTAR BAGIAN					
No	Tag	Uraian	Bahan	Jml	kg
1	DG-301	Degasser vakum Ø1600 x 4000, 8 m³	SA-516-70 / epoksi	1	1850
2	K-303	Pompa vakum cincin cair + separator	CF8M, 5,5 kW	1	420
3	P-301A/B	Pompa resirkulasi lumpur 585 m³/hari	CF8M, 7,5 kW, VSD	2	2x560
4	P-302	Pompa umpan settler	CF8M, 5,5 kW	1	430
5	P-303	Pompa lumpur buangan -> PM-10	PC, 3 kW	1	260
6	–	Panel MCC + PLC + analis FOS/TAC	IP54	1	820
7	LS-301	Settler lamella 81 m² proyeksi	S275 + epoksi	1	6900
8	–	Paket pelat miring 60°, jarak 80 mm	PP / FRP	1	1300
9	–	Tangga + platform akses	S275 galv.	1	540
10	–	Skid 40 ft x 2 + perpipaan, katup	S275 galv.	2	2x2600

CATATAN :

1. Proses kontak: reaktor -> DG-301 (vakum -0,3 bar, CH4 terlarut kembali ke jalur gas) -> LS-301 -> underflow 585 m³/hari kembali ke reaktor (P-301), buangan 110 m³/hari ke screw press (P-303).
2. Tangkapan padatan 85 %; SRT 12 hari.
3. Masuk LS-301 dari DG-301 di ujung barat (kiri B-B).
4. Membran AnMBR = opsi PM-11 (tidak termasuk).

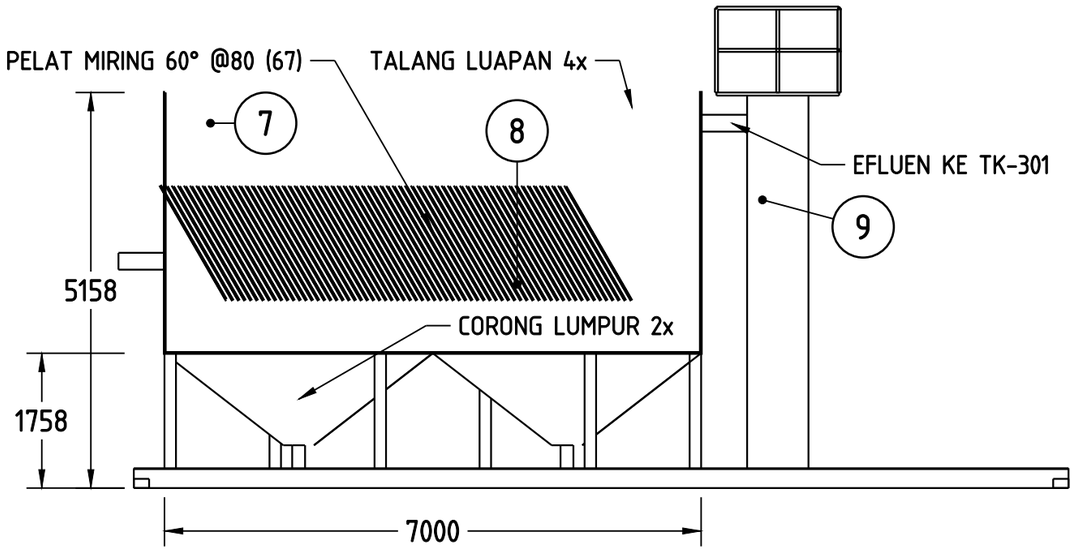

PM-4B POTONGAN B-B (SETTLER LAMELLA) 1:80



PM-4B UJUNG 1:80

University: UNIVERSITAS	Checked by : –	Design Lab.	Document type: Assembly Drawing	Rev: 2
	Author : NAMA TIM	PM-4 Skid Kontak DG-301 + LS-301	Unit: mm / Scale: 1 : 80 / Creation date: 15/10/2026	Size: A3
	Eng. Approved by : –		BG-M-004	Sheet number: 3 / 9
